PECÀN
coffee & bakery


ПЛАН ОТКРЫТИЯ КОФЕЙНИ-ПЕКАРНИ · АСТАНА, ПР. ТҰРАН, 52/4

Состояние на 18 окт 2026 · ведёт команда PECÀN


15 фев 2027 техническое открытие **13 мар 2027** торжественное открытие **82** работ и вех в 12 этапах

● Команда PECÀN ● Подрядчики по дизайну ● Строители ● Поставщики и логистика ● Шефы и персонал ▮ закрашено — выполнено ◆ веха КП — критический путь голубой фон — праздники и закрытие фабрик КНР вертикальная линия — 18 окт


РАБОТА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	СРОК	%
СТАРТ ПРОЕКТА			
Бриф, обмерный план, айдентика и брендбук переданы	● Команда PECÀN	16 сен – 17 сен	100%
Договор подписан	● Команда PECÀN	27 сен	✓
Календарный план проекта	● Команда PECÀN	28 сен – 5 окт	100%
Регистрация ТОО, расчётный счёт, ОКЭД 56101	● Команда PECÀN	19 окт – 30 окт	0%
АНАЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ			
Анализ конкурентов района Туран	● Команда PECÀN	28 сен – 9 окт	100%
Замер трафика у входа и оценка потока гостей	● Команда PECÀN	28 сен – 10 окт	100%
Маркетинговая стратегия и ассортиментная матрица	● Команда PECÀN	5 окт – 18 окт	100%
Финансовая модель: CAPEX, OPEX, P&L, Cash Flow	● Команда PECÀN	5 окт – 18 окт	100%
Защита финмодели и бюджета	● Команда PECÀN	20 окт	◇
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ			
Технологическое зонирование: варианты планировки КП	● Команда PECÀN	28 сен – 9 окт	100%
Проект ТХ: комплект чертежей по СанПиН и ХАССП КП	● Команда PECÀN	12 окт – 30 окт	0%
Зонирование согласовано КП	● Команда PECÀN	18 окт	✓
Задание на инженерные сети: точки подключения и нагрузки оборудования	● Команда PECÀN	19 окт – 30 окт	0%
Раздел ТХ и задание на инженерные сети сданы	● Команда PECÀN	2 ноя	◇
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ			
Концепция интерьера и планировочное решение КП	● Команда PECÀN	19 окт – 30 окт	60%
Подбор подрядчиков на точечные услуги по дизайну КП	● Команда PECÀN	19 окт – 30 окт	0%
3D-визуализации интерьера КП	● Команда PECÀN	26 окт – 6 ноя	30%
Договоры на услуги по дизайну подписаны КП	● Команда PECÀN	30 окт	◇
Сверка визуализаций с технологическим зонированием	● Команда PECÀN	2 ноя – 6 ноя	0%
Рабочая документация: чертежи, ведомости, смета риск КП	● Подрядчики по дизайну	2 ноя – 20 ноя	0%
Авторский надзор дизайнера: выезды на объект, контроль отделки	● Подрядчики по дизайну	2 ноя – 9 фев	0%
Вывеска: эскиз, согласование, изготовление, монтаж	● Команда PECÀN	9 ноя – 22 янв	0%
Дизайн-проект готов полностью КП	● Команда PECÀN	20 ноя	◇
Интерьер принят дизайнером по проекту	● Подрядчики по дизайну	9 фев	◇
СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТДЕЛКА			
Поиск строительной бригады: кандидаты, объекты, отзывы КП	● Команда PECÀN	5 окт – 21 окт	0%
Сметы от бригад и сравнение предложений КП	● Команда PECÀN	22 окт – 28 окт	0%
Договор подряда подписан КП	● Команда PECÀN	30 окт	◇
Строители вышли на объект	● Строители	2 ноя	◇
Рабочие схемы электрики, воды и вентиляции с расчётами	● Строители	2 ноя – 6 ноя	0%
Черновые работы и перегородки	● Строители	2 ноя – 20 ноя	0%

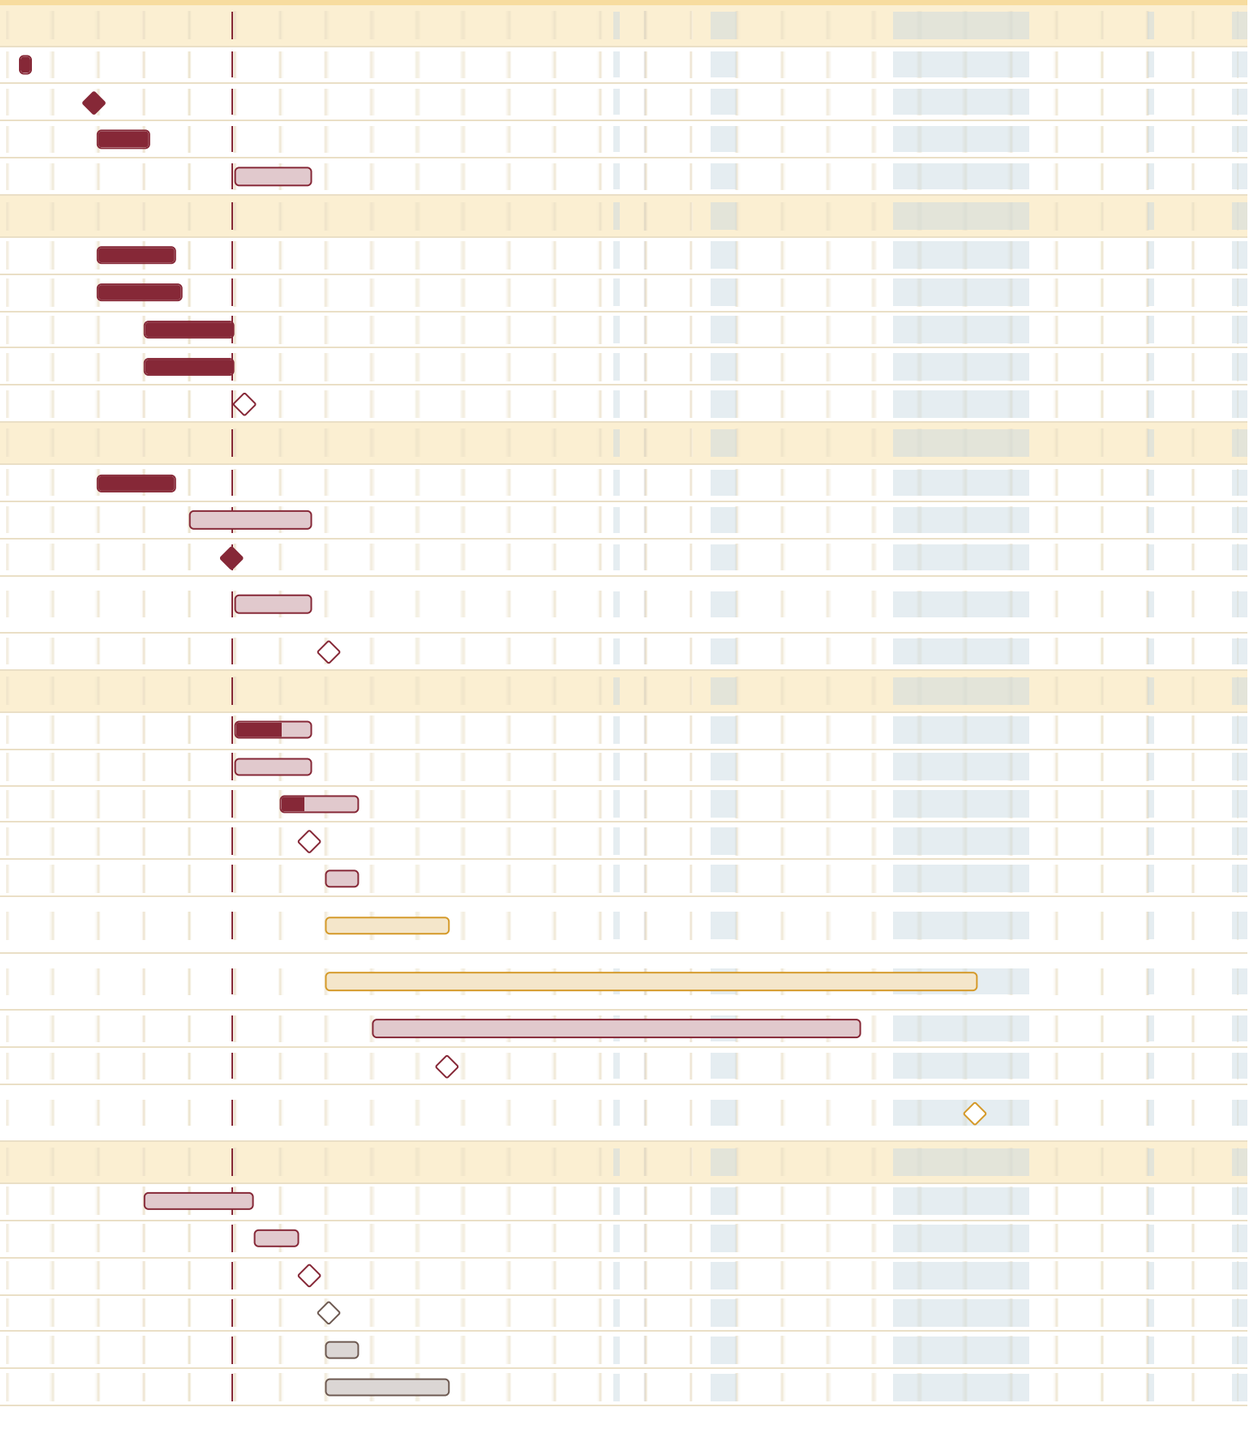

РАБОТА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	СРОК	%
Электрика, вода, канализация, трапы, жироуловитель	Строители	9 ноя – 4 дек	0%
Технологический надзор за выводами коммуникаций	Команда PECÀN	9 ноя – 11 дек	0%
Вентиляция и кондиционирование	Строители	16 ноя – 11 дек	0%
Чистовая отделка	Строители	7 дек – 15 янв	0%
Свет, сантехника, столярные изделия	Строители	4 янв – 22 янв	0%
Приёмка строительной готовности	Команда PECÀN	25 янв	◇
Генеральная уборка после ремонта	Строители	25 янв – 27 янв	0%
КОМПЛЕКТАЦИЯ И КИТАЙ			
Спецификации технологического оборудования и инвентаря КП	Команда PECÀN	26 окт – 13 ноя	0%
Подготовка поездки: маршрут фабрик, визы, билеты	Команда PECÀN	2 ноя – 20 ноя	0%
Спецификации мебели, света и посуды по дизайн-проекту КП	Команда PECÀN	9 ноя – 20 ноя	0%
Спецификации и бюджет закупок утверждены КП	Команда PECÀN	20 ноя	◇
Выездная сессия в Китае: Гуанчжоу, Фошань КП	Команда PECÀN	23 ноя – 29 ноя	0%
Размещение заказов и предоплата фабрикам КП	Команда PECÀN	30 ноя – 4 дек	0%
Заказ кофемашины у дилера в Казахстане	Команда PECÀN	30 ноя – 11 дек	0%
Производство на фабриках КП	Поставщики и логистика	7 дек – 8 янв	0%
Контроль качества и отгрузка из Китая риск КП	Поставщики и логистика	4 янв – 13 янв	0%
Доставка и таможенное оформление КП	Поставщики и логистика	13 янв – 29 янв	0%
Оборудование и мебель на объекте КП	Поставщики и логистика	29 янв	◇
Монтаж оборудования, пусконаладка КП	Поставщики и логистика	1 фев – 7 фев	0%
Расстановка мебели, свет, декор	Подрядчики по дизайну	3 фев – 9 фев	0%
КОМАНДА			
Штатное расписание, фонд оплаты труда, KPI	Команда PECÀN	2 ноя – 13 ноя	0%
Подбор шеф-пекаря и шеф-бариста	Команда PECÀN	16 ноя – 11 дек	0%
Поиск управляющего	Команда PECÀN	16 ноя – 18 дек	0%
Подбор линейного персонала	Команда PECÀN	4 янв – 29 янв	0%
Оформление сотрудников и медицинские книжки	Команда PECÀN	25 янв – 5 фев	0%
Штат укомплектован: 10–14 человек	Команда PECÀN	29 янв	◇
МЕНЮ И ПРОДУКТ			
Концепция меню	Команда PECÀN	9 ноя – 27 ноя	0%
Рецептуры и технологические карты	Шефы и персонал	7 дек – 22 янв	0%
Упаковка, печать меню, форма персонала	Команда PECÀN	4 янв – 5 фев	0%
Поставщики сырья: отбор и договоры	Команда PECÀN	11 янв – 5 фев	0%
Проработки и дегустации на объекте	Шефы и персонал	8 фев – 13 фев	0%
АВТОМАТИЗАЦИЯ И IT			
Закупка касс, принтеров, лицензий iiko	Команда PECÀN	11 янв – 22 янв	0%
Настройка iiko: номенклатура, склады, техкарты	Команда PECÀN	25 янв – 12 фев	0%
Бонусная программа лояльности	Команда PECÀN	1 фев – 12 фев	0%
Kaspi Pay, Webkassa, кассовая зона	Команда PECÀN	1 фев – 12 фев	0%
Дашборд для владельцев	Команда PECÀN	8 фев – 19 фев	0%
Заявки в Wolt, Yandex Eats, Glovo, Choco	Команда PECÀN	8 фев – 26 фев	0%

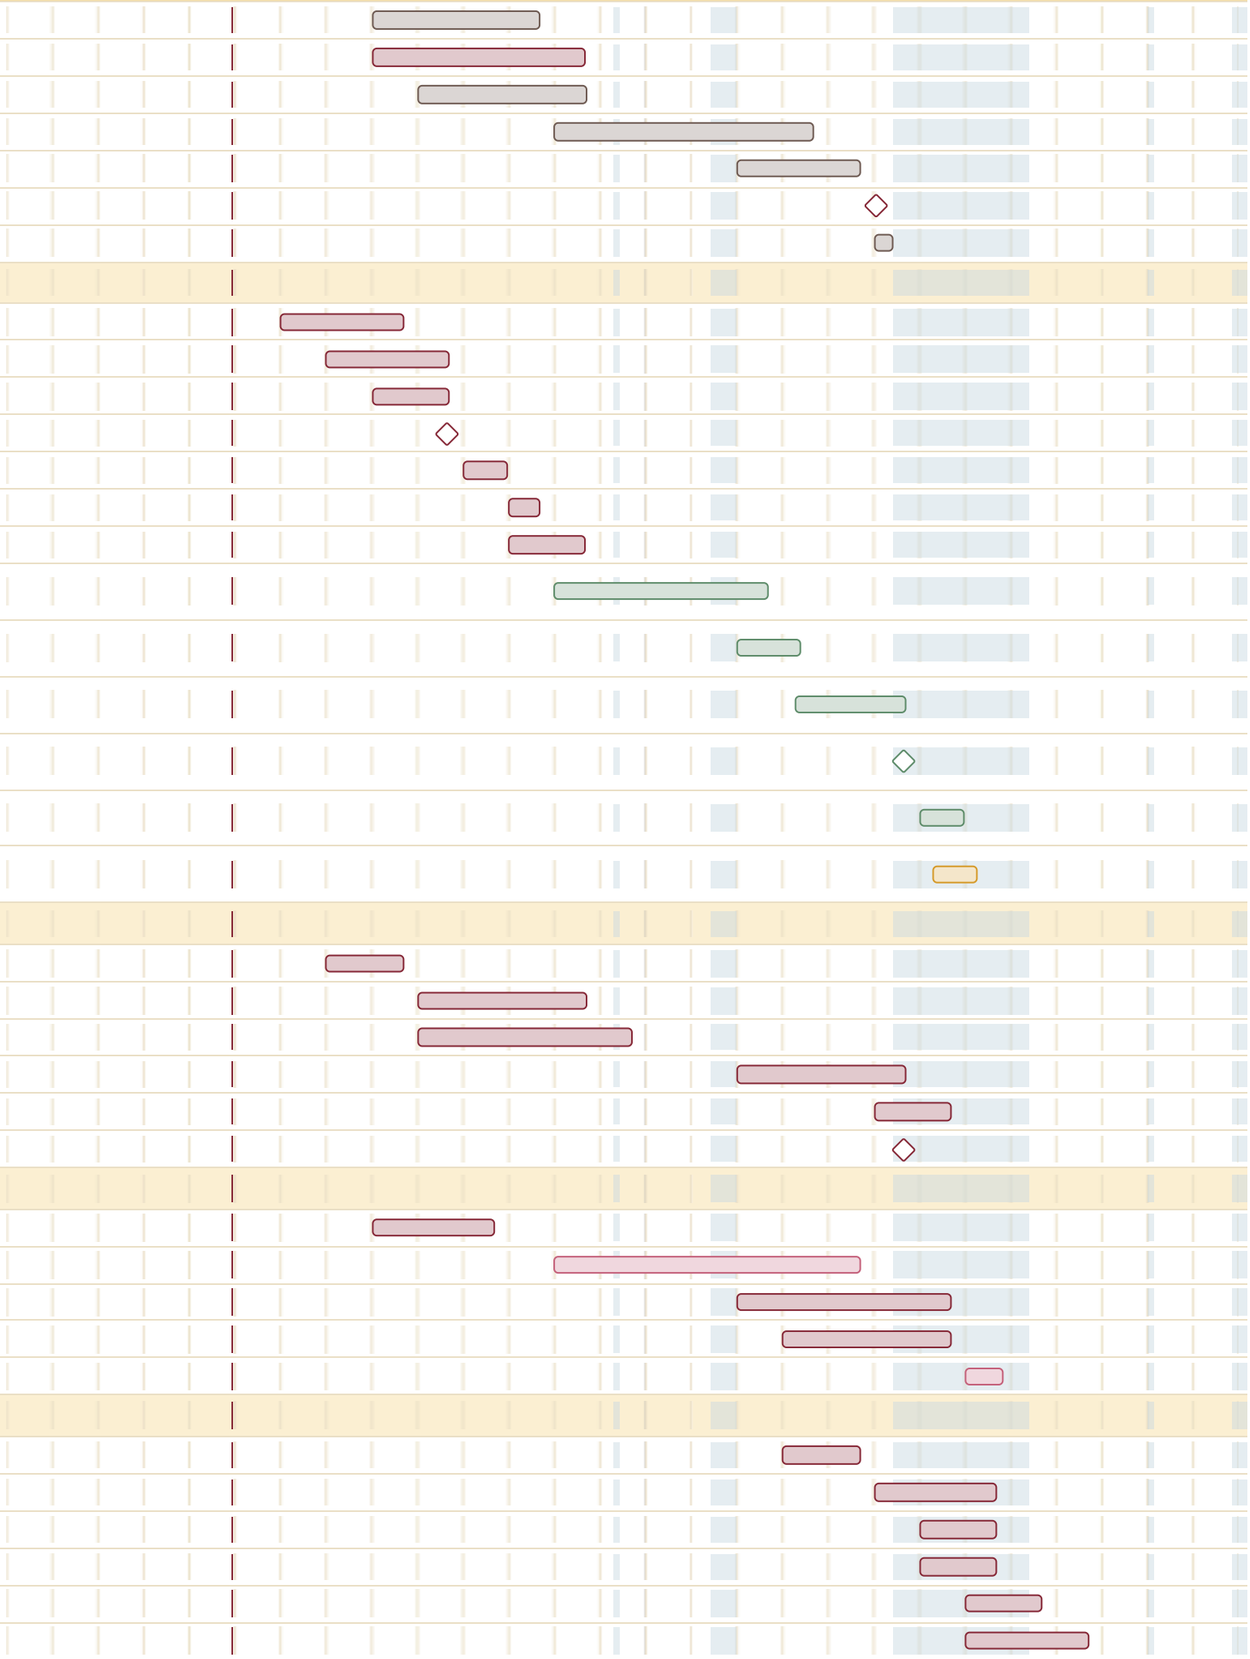

РАБОТА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	СРОК	%
СТАНДАРТЫ И ОБУЧЕНИЕ			
Service Book, должностные инструкции, чек-листы, ХАССП	Команда PECÀN	16 ноя – 18 дек	0%
Обучение управляющего	Команда PECÀN	25 янв – 5 фев	0%
Договоры ЖКХ, вывоз отходов, уведомление о начале деятельности	Команда PECÀN	25 янв – 12 фев	0%
Академия PECÀN: бариста, пекарня, кухня, сервис КП	Команда PECÀN	8 фев – 13 фев	0%
Аттестация команды КП	Команда PECÀN	13 фев	◇
МАРКЕТИНГ ЗАПУСКА			
Медиаплан запуска	Команда PECÀN	26 окт – 13 ноя	0%
Instagram: прогрев до открытия	Команда PECÀN	4 янв – 13 мар	0%
Карточки в 2ГИС, Яндекс и Google	Команда PECÀN	1 фев – 12 фев	0%
Подготовка торжественного открытия	Команда PECÀN	15 фев – 12 мар	0%
ЗАПУСК			
Первый закуп продуктов и расходников	Команда PECÀN	10 фев – 14 фев	0%
Техническое открытие КП	Команда PECÀN	15 фев	◇
Тестовая эксплуатация, 10 дней КП	Команда PECÀN	15 фев – 24 фев	0%
Работа в мягком режиме, доводка процессов	Шефы и персонал	25 фев – 12 мар	0%
Торжественное открытие КП	Команда PECÀN	13 мар	◇
Итоговый аудит и акт, передача кофейни владельцам	Команда PECÀN	15 мар – 19 мар	0%

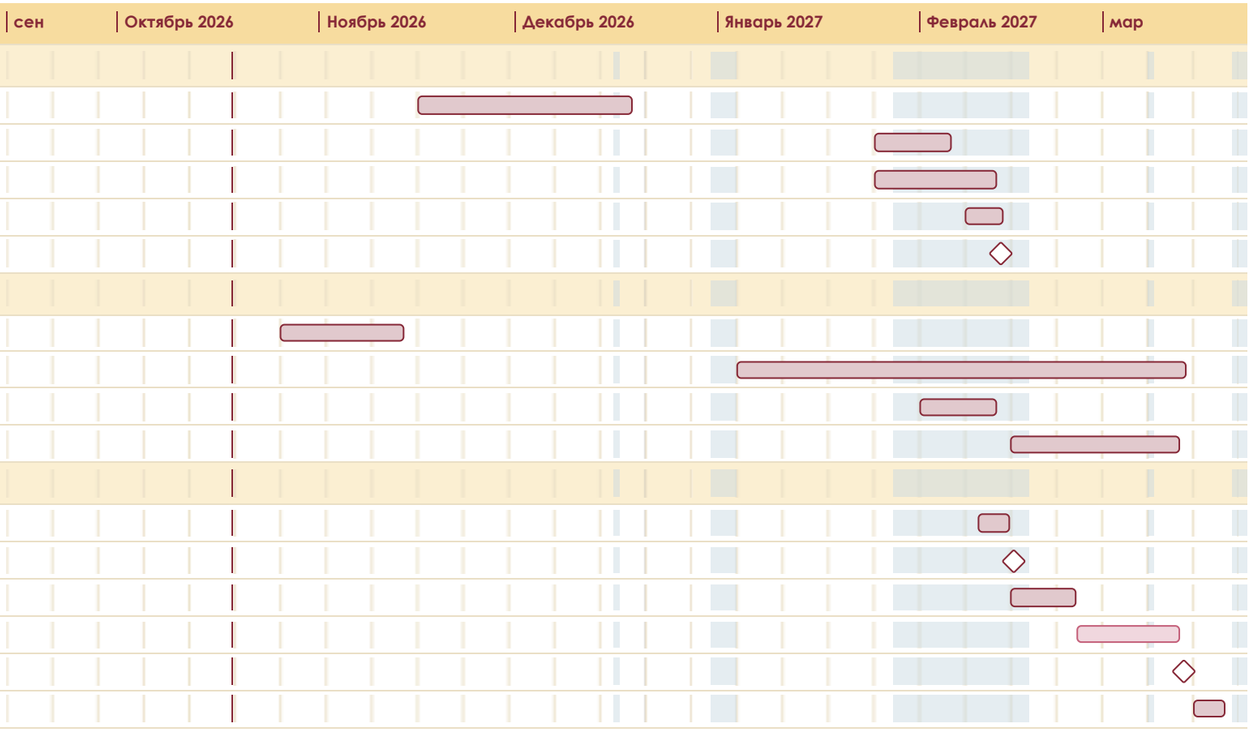

ВЕХИ

ДАТА	ВЕХА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	УСЛОВИЕ И ДЕТАЛИ
27 сен 2026	Договор подписан	Команда PECÀN	Подписание договора на сопровождение открытия кофейни-пекарни. С этой даты идёт отсчёт всех работ.
18 окт 2026	Зонирование согласовано КП	Команда PECÀN	Выбор одного варианта планировки из предложенных. От него зависят проект ТХ, дизайн и работа строителей.
20 окт 2026	Защита финмодели и бюджета	Команда PECÀN	Встреча, на которой проходим финансовую модель и бюджет открытия: откуда каждая цифра и где можно сэкономить.
30 окт 2026	Договор подряда подписан КП	Команда PECÀN	Подписание договора подряда с выбранной бригадой. В договоре: сроки по этому графику, поэтапная оплата, закупка материалов по проектной смете.
30 окт 2026	Договоры на услуги по дизайну подписаны КП	Команда PECÀN	Договоры с выбранными исполнителями: рабочая документация, свет и розетки, вывеска, авторский надзор. В договорах фиксируются даты сдачи и оплата по этапам.
2 ноя 2026	Раздел ТХ и задание на инженерные сети сданы	Команда PECÀN	Передача готового раздела ТХ и задания на инженерные сети. С этого момента строители могут выходить на объект и делать рабочие схемы.
2 ноя 2026	Строители вышли на объект	Строители	Начало ремонта: бригада заходит на объект с материалами и инструментом.
20 ноя 2026	Спецификации и бюджет закупок утверждены КП	Команда PECÀN	Утверждение списка закупок и суммы, которую готовы на них потратить.
20 ноя 2026	Дизайн-проект готов полностью КП	Команда PECÀN	Сдача всего дизайн-проекта: концепция, визуализации, рабочая документация. Он должен быть готов до поездки в Китай, потому что по нему закупаются мебель и свет.
25 янв 2027	Приёмка строительной готовности	Команда PECÀN	Совместный обход помещения после ремонта: команда PECÀN, строители, дизайнер. Проверяем качество работ и готовность принять оборудование.
29 янв 2027	Штат укомплектован: 10–14 человек	Команда PECÀN	Финальная проверка: все должности закрыты, люди подтвердили выход.
29 янв 2027	Оборудование и мебель на объекте КП	Поставщики и логистика	Разгрузка и приёмка: пересчитываем места, проверяем целостность упаковки и комплектность.
9 фев 2027	Интерьер принят дизайнером по проекту	Подрядчики по дизайну	Финальный обход помещения с дизайнером после расстановки мебели и декора.
13 фев 2027	Аттестация команды КП	Команда PECÀN	Экзамен для каждого сотрудника: теория по меню и стандартам плюс практика на рабочем месте.
15 фев 2027	Техническое открытие КП	Команда PECÀN	Первый рабочий день без рекламы и вывески о запуске. Принимаем первых гостей и проверяем все процессы в реальной работе.
13 мар 2027	Торжественное открытие КП	Команда PECÀN	Официальное открытие PECÀN с гостями, блогерами и праздничной программой.

РИСКИ И КАК ИХ СНИЖАЕМ

ЗАДАЧА	СРОК	В ЧЁМ РИСК	ЧТО ДЕЛАЕМ
Рабочая документация: чертежи, ведомости, смета	2 ноя – 20 ноя	Рабочие чертежи для строителей, план освещения, план розеток и выключателей в зале, ведомости отделки, мебели и освещения, проектная смета. Выполняет подрядчик по выбранной концепции команды PECÀN. Срок сжатый: три недели от договора до полного комплекта.	• В договоре с подрядчиком закрепить дату сдачи рабочей документации — 20 ноября, оплата по этапам. • Выбирать исполнителя с готовой командой чертёжников. Спросить о текущей загрузке. • В первый день передать проект зонирования, выбранную концепцию интерьера и брендбук. • Ведомости мебели, света и отделки получить первыми, к 13 ноября: они нужны для поездки в Китай. • Согласовывать материалы за 1–2 дня, а не за 3. • Строители выходят 2 ноября по проекту ТХ и не ждут дизайн.
Контроль качества и отгрузка из Китая	4 янв – 13 янв	Проверяем готовый товар на фабриках перед упаковкой и отправляем. Отгрузка с запасом до закрытия фабрик на Китайский Новый год.	• Разместить заказы и внести предоплату в первую неделю после поездки, до 4 декабря. • В контракте с фабрикой указать дату готовности 8 января и удержание за просрочку. • Брать позиции из стандартных линеек с коротким сроком. Изготовление на заказ оставить только там, где без него нельзя. • Раз в неделю получать от фабрики фото и видео хода производства. • За неделю до готовности отправить на фабрику инспектора по качеству.

НА ЧЁМ ДЕРЖИТСЯ ГРАФИК

- Проектная документация дизайна готова полностью до выезда в Китай: по ней собираются закупочные спецификации.
- Фабричные заказы отгружаются до Китайского Нового года (6 февраля 2027). Опоздание сдвигает открытие на 3–4 недели.
- Сроки доставки и таможни зависят от перевозчика и терминалов на границе. После прибытия груза на монтаж и пусконаладку нужно до 14 дней.
- Материалы согласуются за 3 рабочих дня. Каждый день задержки согласования сдвигает зависимые работы.
- Торжественное открытие назначено на субботу после Ораза айта и до Наурыза. Дату уточняем в январе.

РОЛИ И ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

КОМАНДА PECÀN

Основатели и Gastro Ultima

- Ведёт проект целиком: график, решения, согласования, бюджет
- Аналитика локации, финансовая модель, маркетинговая стратегия
- Технологический проект, задание на инженерные сети, технологический надзор
- Концепция интерьера и 3D-визуализации, выбор подрядчиков по дизайну и строительной бригады
- Спецификации, выездная сессия в Китае, оплата оборудования и логистики
- Юрлицо, счёт, договоры с ЖКХ и поставщиками сырья
- Подбор команды, обучение, аттестация
- iiko, лояльность, стандарты, ХАССП, запуск и открытие

ПОДРЯДЧИКИ ПО ДИЗАЙНУ

Точечные услуги · выбираем до 30 октября

- Рабочие чертежи для строителей, ведомости отделки и мебели, смета
- План освещения, розеток и выключателей
- Эскиз фасадной вывески
- Авторский надзор за отделкой и декором

СТРОИТЕЛИ

Новая бригада · выбираем до 30 октября

- Черновые работы и перегородки по проекту
- Рабочие схемы сетей с расчётами
- Электрика 380 В, вода, канализация, трапы, жироуловитель
- Вентиляция и кондиционирование
- Чистовая отделка, свет, сантехника
- Сдача помещения по акту строительной готовности

ПОСТАВЩИКИ И ЛОГИСТИКА

Фабрики KHP, дилер кофемашины, карго, таможня

- Производство оборудования, мебели, света, посуды
- Поставка кофемашины от дилера в Казахстане
- Отгрузка до Китайского Нового года
- Доставка, таможенное оформление, разгрузка на объекте

ШЕФЫ И ПЕРСОНАЛ

Шеф-пекарь, шеф-бариста, управляющий, линейный персонал

- Рецептуры и технологические карты
- Проработки и дегустации меню
- Обучение в Академии PECÀN и аттестация
- Работа смен в тестовом режиме и на открытии

Актуальная версия графика ведётся на сайте проекта. Этот документ отражает состояние на 18 окт 2026.
